

**CONTRATO:** No. 025 DE 2014

**OBJETO:** Construcción red alcantarillado Pluvial carrera 19 calles 36 norte a 44 norte

**DURACIÓN:** 85 días

**FECHA DE INICIO:** 26 de diciembre de 2014

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 20 de marzo de 2015

**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:** 70%

**EMPLEOS DIRECTOS:** 15 empleos

**LOGROS ALCANZADOS:** Solución a la problemática evidenciada en el sector por la insuficiencia de la red principal de alcantarillado para transportar las aguas residuales y aguas lluvias del sector. Con la construcción de la red pluvial queda resuelto este inconveniente en gran medida.



**CONTRATO:** No. 032 DE 2014

**OBJETO:** Construcción red alcantarillado sanitario Barrio Las Américas calle 23 carreras 30, 31 y 32

**DURACIÓN:** 45 días

**FECHA DE INICIO:** 31 de diciembre de 2014

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 3 de marzo de 2015

**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:** 100%

**EMPLEOS DIRECTOS:** 12 empleos

**LOGROS ALCANZADOS:** Solución a la problemática evidenciada en el sector por la inexistencia de la red principal de alcantarillado para transportar las aguas residuales, las cuales se estaban vertiendo a la ladera posterior a las viviendas generando problemas al talud y al medio ambiente. Con la construcción de la red sanitaria queda resuelto este inconveniente, solo queda notificar a cada usuario para que realice la conexión de su acometida domiciliaria a la caja de inspección construida por EPA E.S.P.



**CONTRATO:** No. 031 DE 2014

**OBJETO:** Construcción red alcantarillado sanitario Barrio Nueva Libertad

**DURACIÓN:** 80 días


**FECHA DE INICIO:** 30 de diciembre de 2014

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 19 de marzo de 2015

**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:** 80%

**EMPLEOS DIRECTOS:** 15 empleos

**LOGROS ALCANZADOS:** Solución a la problemática evidenciada en el sector por la inexistencia de la red principal de alcantarillado para transportar las aguas residuales, las cuales se estaban vertiendo a la ladera generando problemas al talud y al medio ambiente. Mediante fallo judicial se condenó al municipio de Armenia para la ejecución de las obras tendientes a solucionar la problemática del Barrio Nueva Libertad, obras que con convenio suscrito con EPA E.S.P., se están ejecutando con el contrato No. 031 explicado en este punto.

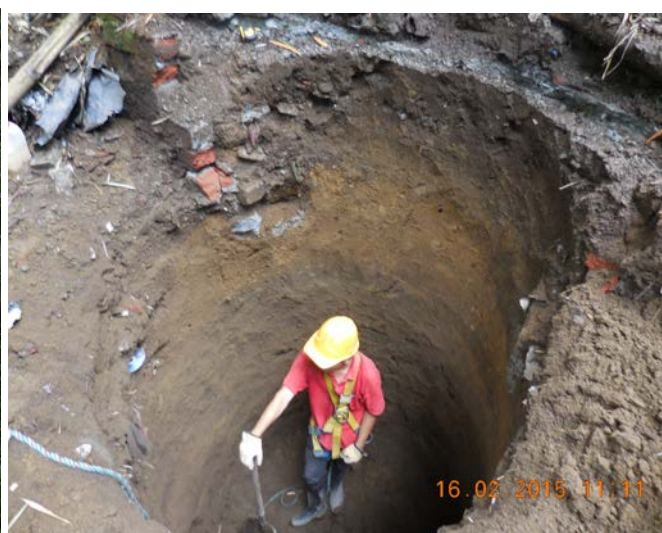

**LUIS FERNANDO LONDOÑO LONDOÑO**  
Gestor Recolección y Transporte

**DIANA SANCHEZ MOLINA**  
Subgerente de Aguas EPA E.S.P. EPA E.S.P.

*Proyectó y Elaboró:*  
Ing. Luis Fernando Londoño Londoño
